

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ
Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının **6.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME** kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **08.04.2008** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Mimar
FEVZİ KILIÇ
İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi

İnşaat Mühendisi
**ATILTA
KESTANLIOĞLU**
İmza

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

VEFA İLTER
İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Makine Mühendisi
**FAHRETTİN
TÜRKDOĞAN**
İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Elektrik Mühendisi
**NAZMI CEMAL
GÜLER**
İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ŞENOL AKYÜZ
İmza

Kontrol Elemanı
Mimar

-

Kontrol Elemanı
Makine Mühendisi

-

Kontrol Elemanı
Elektrik Mühendisi

-

Yapı Müteahhidi
veya adına Şantiye
Şefi

**ŞENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.H.**

ŞENKA İNŞ. İmza
Şantiye Şefi
İmza

BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ
Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının 6.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME, 08.04.2008 tarihinde gerçekleştirilen 35 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

YEFKALTEK
İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

SENOL AKYÜZ
İmza

Yardımcı Kontrol
Elemanı
Teknik Öğretmen/
İnşaat Teknikeri/
Teknisyen/

İmza

Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

ŞENKA
İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
İmza

Laboratuar
Teknisyeni

İmza

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ

Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-

Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.

Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının 5.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 01.03.2008 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama
Denetçisi
Mimar

FEVZİ KILIÇ

İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

ATILLA
KESTANCIÖĞLU

İmza

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

VEFA ALTIN

İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi
Makine Mühendisi

FAHRETTİN
TUNALI

İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi
Elektrik Mühendisi

NAZMI ÇELİK
GÜLER

İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ŞENOL AKYÜZ

İmza

Kontrol Elemanı
Mimar

-

Kontrol Elemanı
Makine Mühendisi

-

Kontrol Elemanı
Elektrik Mühendisi

-

Yapı Müteahhidi
veya adına Şantiye
Şefi

ŞENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

ŞENKA İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yatırım ve İnşaat
Boşluklu V.E. 33 02 0298

BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ
Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve


Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının 5.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME, 01.03.2008 tarihinde gerçekleştirilen 35 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi


VEFAİ İLTER
İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi


ŞENOL AKIÜZ
İmza


Yardımcı Kontrol
Elemanı
Teknik Öğretmen/
İnşaat Teknikeri/
Teknisyen/
-

İmza

Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi


ŞENKA
İNŞ. TAHAH. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
İmza

Laboratuar
Teknisyeni


İmza

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ

Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-

Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.

Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının **4.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME** kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **21.02.2008** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama
Denetçisi
Mimar

FEVZİ KILIÇ
İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

SENOL AKYÜZ
İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

ATILTA
KESTANCI OĞLU
İmza

Kontrol Elemanı
Mimar

-

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

VEFA İLTER
İmza

Kontrol Elemanı
Makine Mühendisi

-

Proje ve Uygulama
Denetçisi
Makine Mühendisi

FAHRETTİN
TÜRKDOĞAN
İmza

Kontrol Elemanı
Elektrik Mühendisi

-

Proje ve Uygulama
Denetçisi
Elektrik Mühendisi

NAZMİ CEMAL
GÜLER
İmza

Yapı Müteahhidi
veya adına Şantiye
Şefi

ŞENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

SENKA İNŞAAT TAAH.
İNŞAAT TAAH. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SİRKÜLER NO: 2008/02
TARİHİ: 20.02.2008

BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ

Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-

Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.

Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının 4.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME, 21.02.2008 tarihinde gerçekleştirilen 35 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

VEFA ALTIN
İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ŞENOL AKYÜZ
İmza

Yardımcı Kontrol
Elemanı
Teknik Öğretmen/
İnşaat Teknikeri/
Teknisyen/
-

İmza

Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

ŞENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

ŞENKA İNŞAAT VE
TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SİRKÜLER NO: 2008/001
TARİH: 21.02.2008

Laboratuvar
Teknisyeni

İmza

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ

Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-

Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.

Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının 3.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 01.02.2008 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Mimar

FEVZİ KILIÇ

İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi

İnşaat Mühendisi

ATILAN

KESTANCI OĞLU

İmza

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

VEFA ALTIN

İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Makine Mühendisi

FATMA

TURKBOĞAN

İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Elektrik Mühendisi

NAZMI CEMAL

GÜLER

İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ŞENOL AKYILIZ

İmza

Kontrol Elemanı
Mimar

Kontrol Elemanı
Makine Mühendisi

Kontrol Elemanı
Elektrik Mühendisi

Yapı Müteahhidi
veya adına Şantiye
Şefi

SENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

SENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ
Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının 3.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME, 01.02.2008 tarihinde gerçekleştirilen 75 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

Yardımcı Kontrol
Elemanı
Teknik Öğretmen/
İnşaat Teknikeri/
Teknisyen/

Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

Laboratuvar
Teknisyeni

VEFA İLTER
İmza

SENOL AKYÜZ
İmza

İmza

ŞENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
SENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
BETON DÖKÜM TUTANAĞI
01.02.2008

İmza

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ
Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının 2.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 20.01.2008 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama

Denetçisi

Mimar

FEVZİ KILIÇ

İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

SENOL ARYUZ

İmza

Proje ve Uygulama

Denetçisi

İnşaat Mühendisi

ATILMA

KESTANLIOĞLU

İmza

Kontrol Elemanı
Mimar

-

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

VEFA İLTER

İmza

Kontrol Elemanı
Makine Mühendisi

-

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Makine Mühendisi

FATİH KURBAN

İmza

Kontrol Elemanı
Elektrik Mühendisi

-

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Elektrik Mühendisi

NAZMI CELAL

GÜLER

İmza

Yapı Müteahhidi
veya adına Şantiye
Şefi

SENKA

İNŞ.TAAH.VE

TİC.LTD.ŞTİ.AH.

SENKA İNŞ.VE
TİC.LTD.ŞTİ.AH.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SİRKÜLER NO: 2008/1
TARİH: 20.01.2008

BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ
Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının 2.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME, 20.01.2008 tarihinde gerçekleştirilen 35 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

YEFA İLTER
İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ŞENOL AKYÜZ
İmza

Yardımcı Kontrol
Elemanı
Teknik Öğretmen/
İnşaat Teknikeri/
Teknisyen/
-

İmza

Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

ŞENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

ŞENKA İNŞ.VE TİC. LTD. ŞTİ.
20.01.2008
İSTANBUL

Laboratuar
Teknisyeni

İmza

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ

Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-

Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.

Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının **1.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME** kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **24.12.2007** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Mimar
FEYZİ KILIÇ
İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ŞENOL AKIN
İmza

Proje ve Uygulama
Denetçisi

İnşaat Mühendisi
**ATIL A
KESTANLIOĞLU**
İmza

Kontrol Elemanı
Mimar

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

VEFA ALTINER
İmza

Kontrol Elemanı
Makine Mühendisi

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Makine Mühendisi
**FAHRETTİN
TUNÇDOĞAN**
İmza

Kontrol Elemanı
Elektrik Mühendisi

Proje ve Uygulama
Denetçisi

Elektrik Mühendisi
**NAZMI ÇELAL
GÜLER**
İmza

Yapı Müteahhidi
veya adına Şantiye
Şefi

**SENKA
İNŞ. TAAH. VE M.
TİC. LTD. ŞTİ.**

BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

YİBF No: 259502

İlgili İdare : ESENYURT BELEDİYESİ

Yapı Sahibi : (D2)SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 19.09.2007 2007/90+-

Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.

Pafta/Ada/Parsel No : 0 / 419 / 26

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2109 m² Betonarme / Çerçeve

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞT. / 407

Yukarıda belirtilen yapının **1.NORMAL KAT KOLON DÖŞEME**, 24.12.2007 tarihinde gerçekleştirilen 35 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi

VEFA İLTER
İmza

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ŞENOL AKYÜZ
İmza

Yardımcı Kontrol
Elemanı
Teknik Öğretmen/
İnşaat Teknikeri/
Teknisyen/

-
İmza

Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

ŞENKA
İNŞ.TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ. TAAH.
ŞENKA İNŞ.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
İmza

Laboratuvar
Teknisyeni

İmza

RAPOR TARİHİ	06,05,08	RAPOR NO	2003	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	------	----------------	-----

FİRMA VE ŞANTIYE BİLGİLERİ	
DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTIYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	F21d24d2c/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ			
NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY		
ÜRETİCİ FİRMA	MARMARA HAZIR BETON	ALINIŞ TARİHİ	08,04,08
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C25 35	ALINIŞ SAATİ	
ALINDIĞI YER	D2.BLOK .6.NORMAL KAT KOLON DENEYİ	KATKI DURUMU	-
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM* 15CM*15CM Hüseyin GENÇ	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE SAYISI	6 İnşaat Teknisyeni		

YAPILAN DENEYLER			
ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)	27
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)	
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-2.NİSAN 2002.TS EN 123,90-3 NİSAN 2003 TS 500/ ŞUBAT 2000			
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN	
1	28,02	29,96	
2	26,83	27,37	
3	24,88	30,34	
ORTALAM A	26,58	29,22	N/mm2
AÇIKLAMA: Ortalama mukavemet >beton mukavemeti + 1			

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

“Laboratuvar İzin Belgesi” ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

Hüseyin GENÇ
İnşaat Teknisyeni



ONAYLAYAN

YASAR SAĞLAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5686

Numune Bilgileri :

Rapor No : 2003
Rapor Tarihi : 06.05.2008


Yapı Sahibi : SELİN EVLER
İnşaat Adresi : YAKUPLU /İSTANBUL
Ada : 419 Pafta : F21d24d2c Parsel : 26
Katlı : *** Beton Cinsi : C-25
Test Standardı : TSEN12390-3 Hazır Beton : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON
Kull. Yer : D2 BLOK 6.NORMAL KAT KOLON Döşeme

Nr.	Kesit Alanı cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık kg/dm3	Birim Ağırlık kg/dm3	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü N.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	225.	3375.	8001.	2.37	28	08.04.08	06.05.08	674035.29	29.96		
2	225.	3375.	8006.	2.37	28	08.04.08	06.05.08	615812.94	27.37		
3	225.	3375.	8002.	2.37	28	08.04.08	06.05.08	682599.42	30.34		
Ortalama:								657482.55	29.22		

Deney Grafiği

Mukavemet (N/mm2)

Kırılma Yüğü (N)

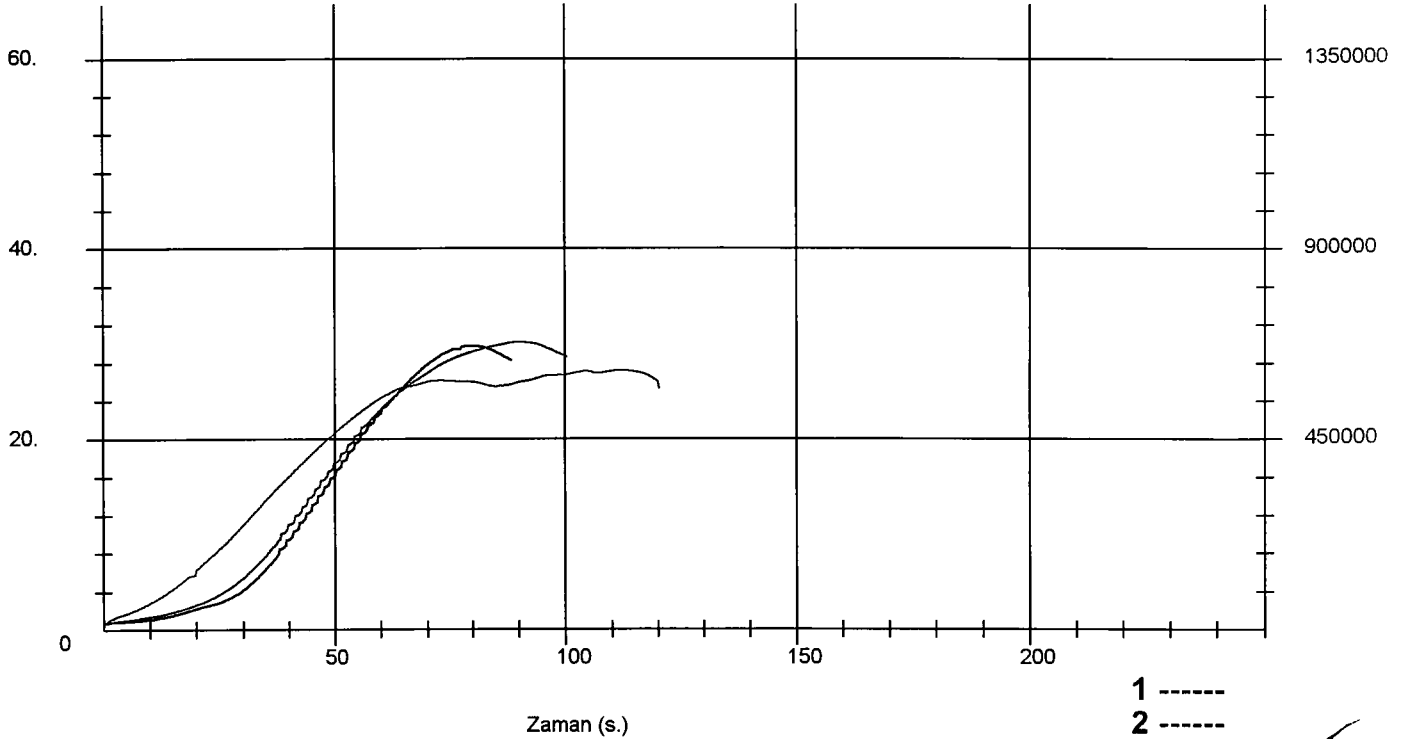

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan
Operator Hüseyin GENÇ



Onaylayan
denetçi: İBRAHİM
İnşaat Mühendisi
Kuruluş Denetçisi
Belge No: 5636

Kayıt yeri : C:\PROGRA~1\BASINC~1\YIRMIS~1\2003.TST
Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

RAPOR TARİHİ	29.03.08	RAPOR NO	1576	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	------	----------------	-----

FİRMA VE SANTIYE BİLGİLERİ	
DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTIYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	/F21d24d2c/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ			
NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY		
ÜRETİCİ FİRMA	OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON	ALINIŞ TARİHİ	01.03.08
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C25 35	ALINIŞ SAATİ	
ALINDIĞI YER	D2 BLOK 1. NORMAL KAT DÖŞEME KOLON	KATKI DURUMU	-
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM*15CM*15CM KÜP	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE SAYISI	6		

YAPILAN DENEYLER			
ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)	27
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)	
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm2)			
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN	
1	28.44	30.96	
2	30.18	31.52	
3	32.14	31.91	
ORTALAM A	30.25	31.46	N/mm2

ACIKLAMA: Ortalama mukavemet > beton mukavemeti + 1

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

"Laboratuvar İzin Belgesi" ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

Hüseyin GENÇ
İnşaat Teknisyeni



YASAR BAĞLAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Deneyçisi
Belge No: 5636

Numune Bilgileri :

Rapor No : 1576
Rapor Tarihi : 29.03.2008


Yapı Sahibi : SELİN EVLER
İnşaat Adresi : MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada : 419 Pafta : F21D24D2C Parsel : 26
Katkı : *** Beton Cinsi : C-25
Test Standardı : TS EN 12390-3 Hazır Beton : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON
Kull. Yer : D2,BLOK 2,NORMAL KAT DÖŞEME KOLON

Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık kg	Birim Ağırlık kg/dm ³	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü N.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	225.	3375.	7912.	2.34	28	01.03.08	29.03.08	696559.05	30.96		
2	225.	3375.	7929.	2.35	28	01.03.08	29.03.08	709253.19	31.52		
3	225.	3375.	7991.	2.37	28	01.03.08	29.03.08	717974.28	31.91		
Ortalama:								707928.84	31.46		

Deney Grafiği

Mukavemet (N/mm²)

Kırılma Yüğü (N)

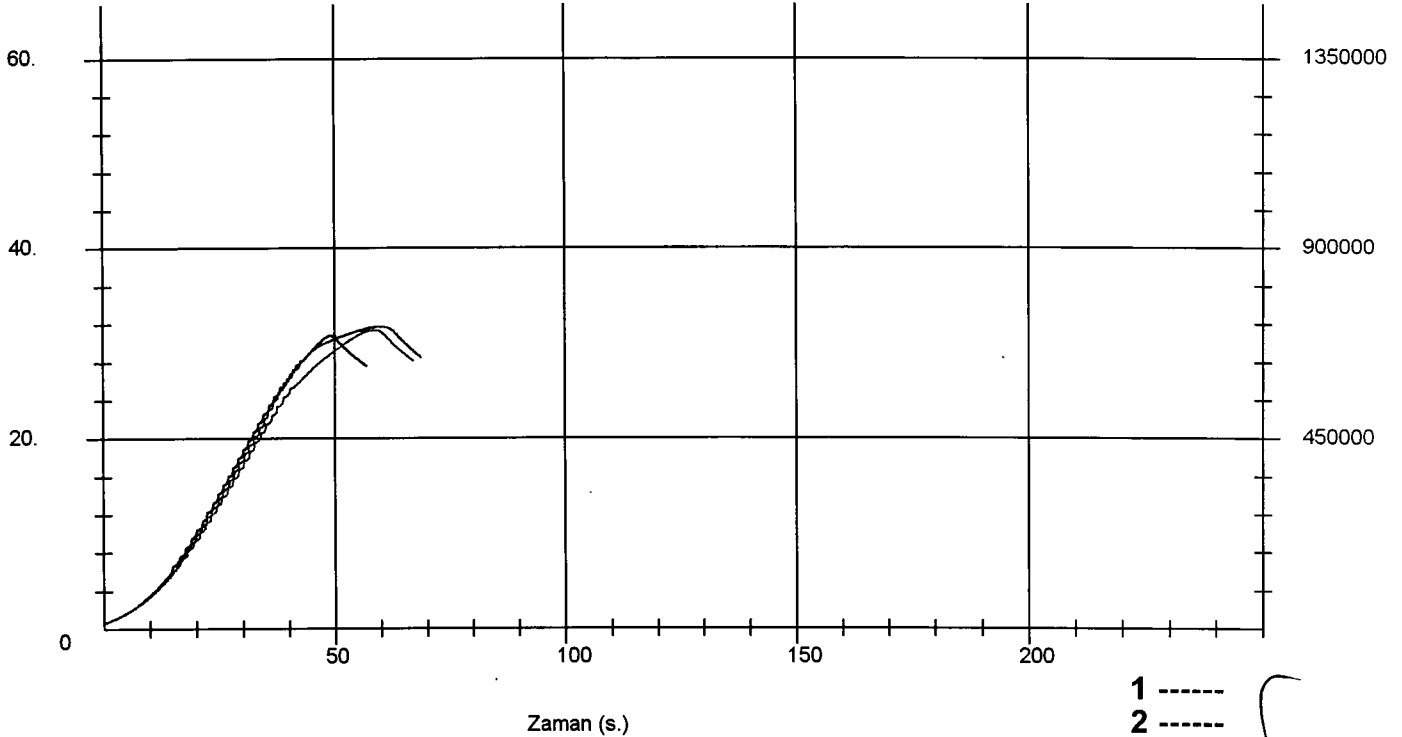

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan
Operator

Hüseyin GENC
İnşaat Teknisyeni



Onaylayan
denetçi
YASAR SAGLAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5656

Yazdırılma Yeri : C:\PROGRA~1\BASINC~1\YIRMIS~1\1576X.TST

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

RAPOR TARİHİ	29.02.08	RAPOR NO	1251	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	------	----------------	-----

FİRMA VE ŞANTİYE BİLGİLERİ	
DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTİYE ADRESİ	YAKUPLU BELDESİ
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	F21D24D2C/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ			
NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY		
ÜRETİCİ FİRMA	OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON	ALINIŞ TARİHİ	01.02.08
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C 25 75	ALINIŞ SAATİ	
ALINDIĞI YER	D2 BLOK 3. NORMAL KAT DÖŞEME	KATKI DURUMU	-
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM* 15CM*15CM KÜP	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE SAYISI	6	İnşaat Teknisyeni	

YAPILAN DENEYLER			
ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)	27
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)	
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm2)			
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN	
1	24.65	32.46	
2	20.77	32.24	
3	25.32	29.68	
ORTALAMA	23.58	31.46	N/mm2

AÇIKLAMA: Ortalama mukavemet >beton mukavemeti + 1

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

"Laboratuvar İzin Belgesi" ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

S. R. DOĞAN
İnşaat Teknisyeni



ONAYLAYAN
A. P. SAKAL
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçi
Belge No: 5686

Numune Bilgileri :


Yapı Sahibi : SELİN EVLER
İnşaat Adresi : YAKUPLU BELDESİ YAKUPLU BELEDİYESİ
Ada : 419 Pafta : F21d24d2c Parsel : 26
Katkı : ** Beton Cinsi : C 25
Test Standardı : TS EN 12390-3 Hazır Beton : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON
Kull. Yer : D2 BLOK 3.KAT DÖŞEME KOLON

Nr.	Kesit Alanı cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağırlık kg/dm ³	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü N.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	225.	3375.	7944.	2.35	28	01.02.08	29.02.08	730354.5	32.46		
2	225.	3375.	7998.	2.37	28	01.02.08	29.02.08	725429.88	32.24		
3	225.	3375.	7987.	2.37	28	01.02.08	29.02.08	667845.18	29.68		
Ortalama:								707876.52	31.46		

Deney Grafiği

Mukavemet (N/mm²)

Kırılma Yüğü (N)

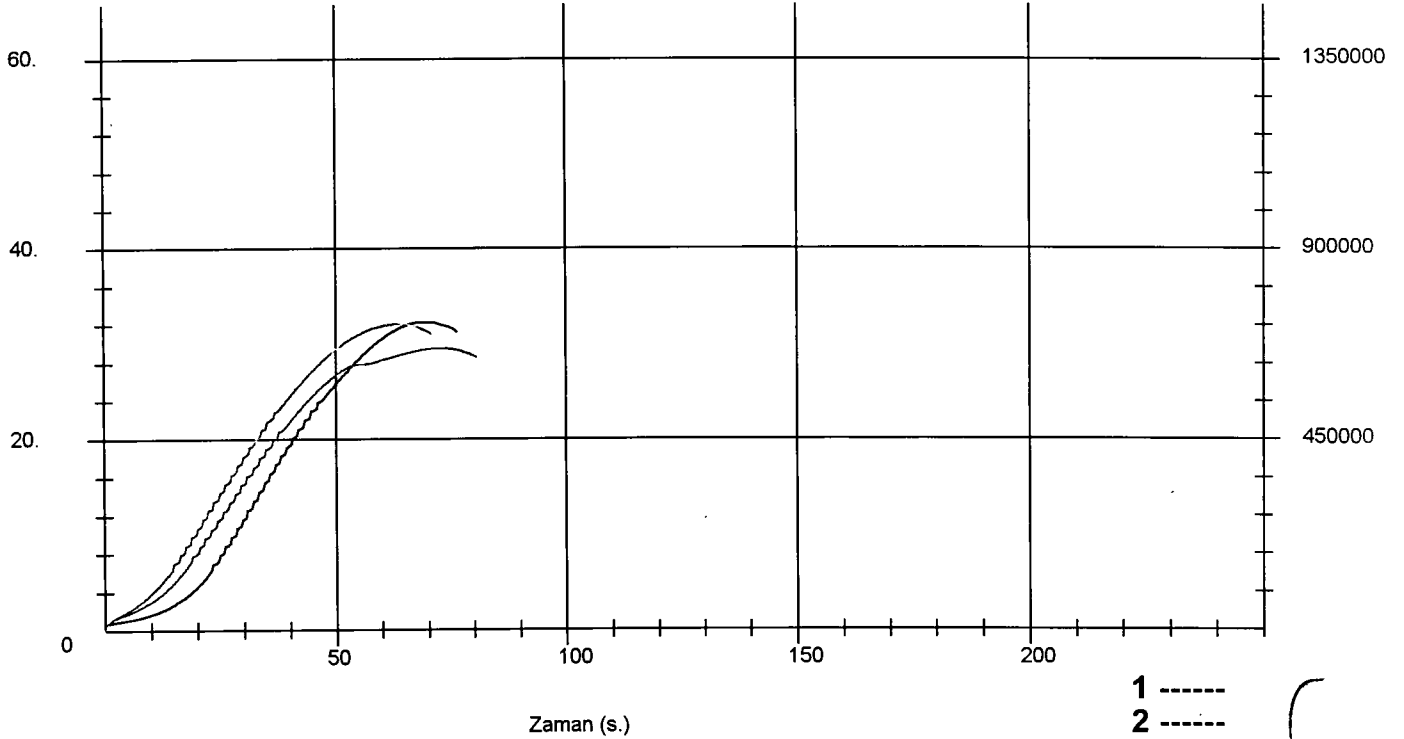

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan
Operatör



Onaylayan
M. AR. SAGLAM
denetçi mühendisi
T.C. M. İ. B. No: 5006

Sarı Ardoğan

Kayıt yeri : C:\PROGRA~1\BASINC~1\SYSTEM1251X.TST

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

RAPOR TARİHİ	20.03.08	RAPOR NO	1444	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	------	----------------	-----

FİRMA VE SANTIYE BİLGİLERİ

DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTIYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CAD. GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	F21D24D2C/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ

NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY		
ÜRETİCİ FİRMA	OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON	ALINIŞ TARİHİ	21.02.08
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C 25 35	ALINIŞ SAATİ	
ALINDIĞI YER	D2 BLOK 4. NORMAL KAT KOLON DÖŞEME	KATKI DURUMU	-
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM* 15CM* 15CM KÜP	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE SAYISI	6	İnşaat Teknisyeni	

YAPILAN DENEYLER

ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)	27
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)	
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm2)			
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN	
1	27.05	32.10	
2	22.24	34.70	
3	26.22	34.03	
ORTALAMA	25.17	33.61	N/mm2

AÇIKLAMA: Ortalama mukavemet > beton mukavemeti + 1


Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

“Laboratuvar İzin Belgesi” ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

Hüseyin GENÇ
İnşaat Teknisyeni

ONAYLAYAN

YAŞAR SAĞLAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5686

Numune

Yapı Sahib
İnşaat Adr

Katkı
Test Stand
Kull. Yer

İ :

N EVLER
MET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
119 Pafta : F21D24D2C Parsel : 26
Beton Cinsi : C-25
N 12390-3 Hazır Beton : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON
NORMAL KAT KOLON DÖŞEME


Rapor No : 1444
Rapor Tarihi : 20.03.2008

Nr.	Hacim cm ³	Ağırlık gr.	Birim Ağırlık kg/dm ³	Nüm. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü N.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	3375	7985	2.37	28	21,02,08	20,03,08	722261.25	32.1		
2	3375	7997	2.37	28	21,02,08	20,03,08	780640.56	34.7		
3	3375	7979	2.36	28	21,02,08	20,03,08	765572.4	34.03		
Ortalama:							756158.07	33.61		

Deney

Mukavemet

Kırılma Yüğü (N)

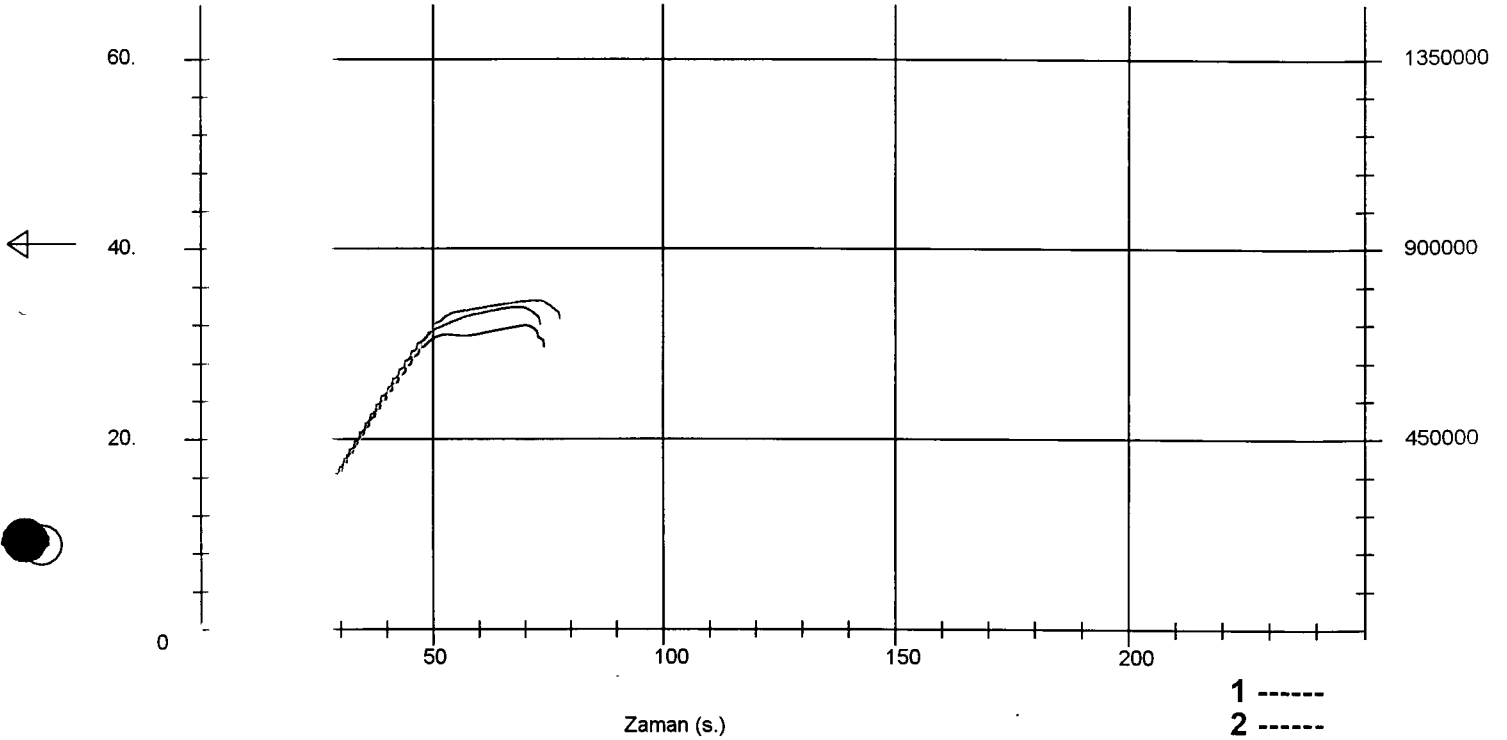

Açıklama

Deneyci

Müseyin GENÇ
İnşaat Teknisyeni

Kayıt No:
Not 1:
Not 2:

İRA~1\BASINÇ~1\YIRMIS~1\1444X.TST
İmzamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Her deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.



Onaylayan
denetçi

Yapı Test Laboratuvarı
Denetçi
Lab. No: 12390-3
Belge No: 135

RAPOR TARİHİ	17.02.08	RAPOR NO	1151	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	------	----------------	-----

FİRMA VE ŞANTIYE BİLGİLERİ

DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTIYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	/F21d24d2c/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ

NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY	ALINIŞ TARİHİ	20.01.08
ÜRETİCİ FİRMA	OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON	ALINIŞ SAATİ	
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C25 35	KATKI DURUMU	-
ALINDIĞI YER	D2 BLOK 2. NORMAL KAT KOLON Düzeme	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM*15CM*15CM KÜP		
NUMUNE SAYISI	6		

YAPILAN DENEYLER

ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)	27
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)	
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm2)			
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN	
1	23.79	35.48	
2	24.11	33.34	
3	25.34	29.31	
ORTALA MA	24.41	32.71	N/mm2

AÇIKLAMA: Ortalama mukavemet > beton mukavemeti + 1

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı "Laboratuvar İzin Belgesi" ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

Hüseyin ÖZKAN
İnşaat Teknisyeni

ASLİ GİBİ
E.İ.B
Belge No:
135

ONAYLAYAN
YASAR GAZİLER
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 6698

Numune Bilgileri :

Rapor No : 1151
Rapor Tarihi : 17.02.2008


Yapı Sahibi : SELİN EVLER
İnşaat Adresi : MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada : 419 **Pafta** : F21d24d2c **Parsel** : 26
Katkı : ** **Beton Cinsi** : C 25
Test Standardı : TS EN 12390-3 **Hazır Beton** : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON
Kull. Yer : D2 BLOK 2.NORMAL KAT KOLON **DÖŞEME**

Nr.	Kesit Alanı cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağırlık kg/dm ³	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü N.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	225.	3375.	7856.	2.34	28	20.01.08	17.02.08	798249.51	35.48		
2	225.	3375.	7895.	2.34	28	20.01.08	17.02.08	750180.51	33.34		
3	225.	3375.	7885.	2.34	28	20.01.08	17.02.08	659438.01	29.31		
Ortalama:								735956.01	32.71		

Deney Grafiği

Mukavemet (N/mm²)

Kırılma Yüğü (N)

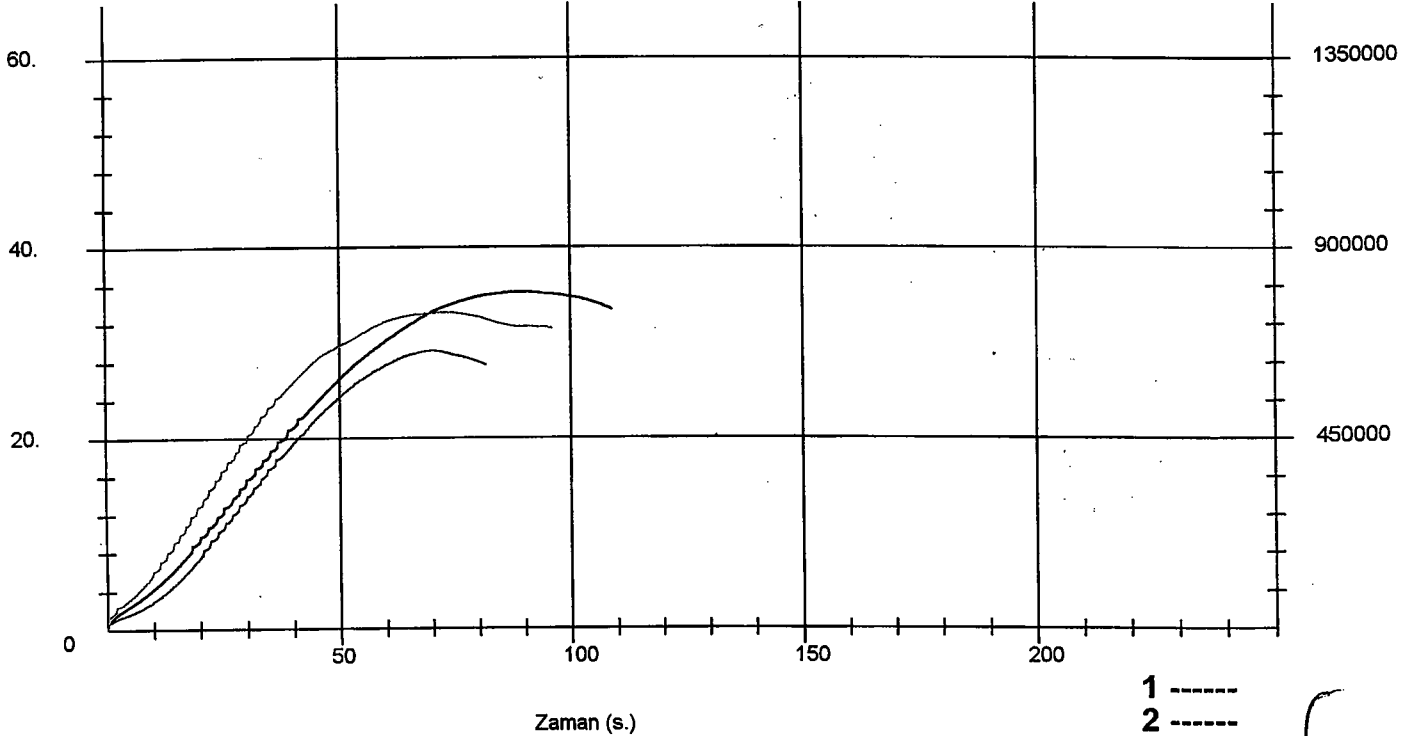

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan

Operatör

Onaylayan

Lab. Şefi

Kayıt yeri : D:\PROGRA~1\BASINC~1\BETONK~1\1151-X.TST

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

BETON BASINÇ DENEY RAPORU

RAPOR TARİHİ	21.01.08	RAPOR NO	986	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	-----	----------------	-----

FİRMA VE ŞANTIYE BİLGİLERİ	
DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTIYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	/F21d24d2c/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ			
NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY		
ÜRETİCİ FİRMA	OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON	ALINIŞ TARİHİ	24.12.07
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C25 35	ALINIŞ SAATİ	
ALINDIĞI YER	D2 BLOK 2. NORMAL KAT KOLON Düzeme	KATKI DURUMU	-
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM*15CM*15CM KUP	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE SAYISI	6		

YAPILAN DENEYLER			
ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)	27
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)	
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm2)			
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN	
1	24.04	31.98	
2	23.74	27.53	
3	22.55	22.05	
ORTALA MA	23.44	27.19	N/mm2

AÇIKLAMA: Ortalama mukavemet > beton mukavemeti + 1

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

"Laboratuvar İzin Belgesi" ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

Semir ERDOĞAN
İnş. Teknisyeni



ONAYLAYAN

YASAR SAĞLAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.: 5686

Numune Bilgileri :

Rapor No : 986
Rapor Tarihi : 21.01.2008


Yapı Sahibi : SELİN EVLR
İnşaat Adresi : MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada : 419 Pafta : F21d24d2c Parsel : 26
Katı : ** Beton Cinsi : C 25
Test Standardı : TS EN 12390-3 Hazır Beton : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON
Kull. Yer : D2 BLOK 2.KAT KOLON D2.2m

Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık kg	Birim Ağırlık kg/dm ³	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü N.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	225.	3375.	7985.	2.37	28	24.12.07	21.01.08	719563.5	31.98		
2	225.	3375.	7965.	2.36	28	24.12.07	21.01.08	619462.26	27.53		
3	225.	3375.	7778.	2.3	28	24.12.07	21.01.08	496209.42	22.05		
Ortalama:								611745.06	27.19		

Deney Grafiği

Mukavemet (N/mm²)

Kırılma Yüğü (N)

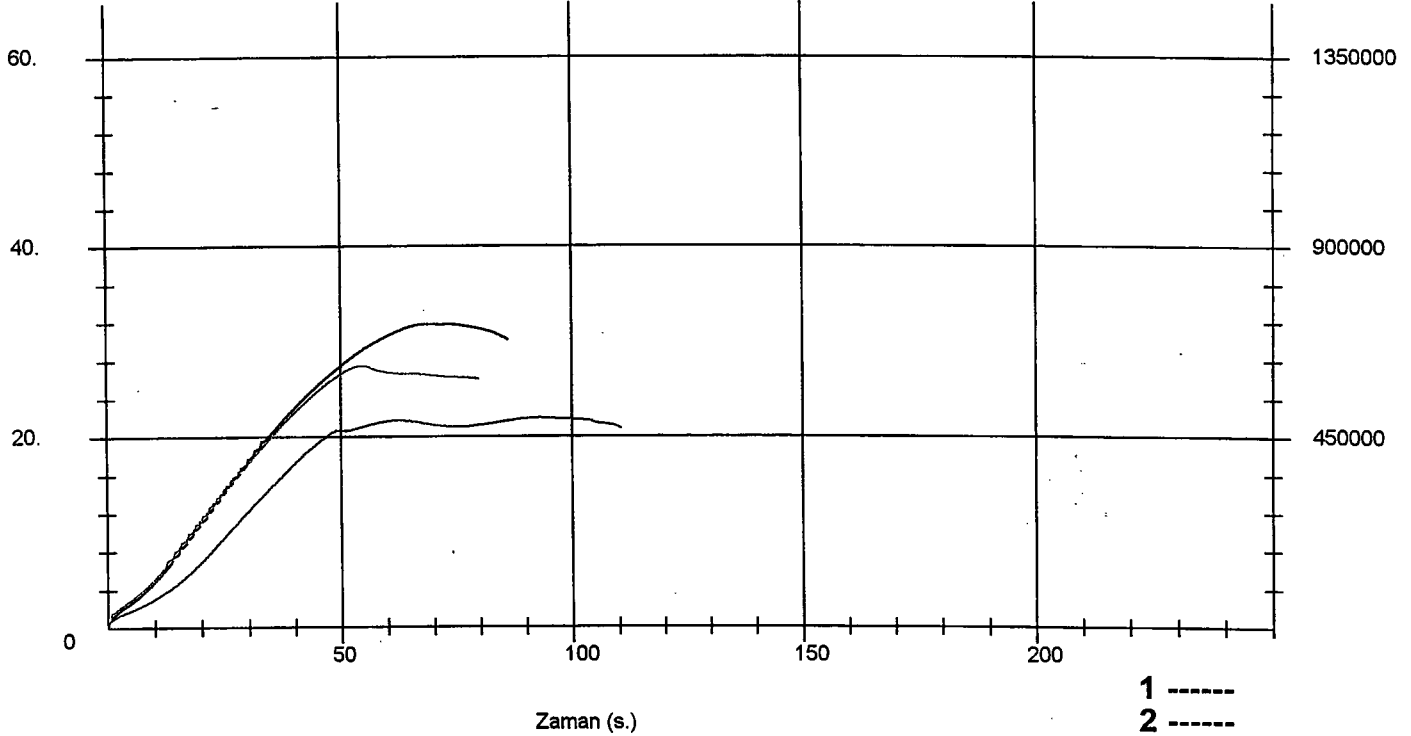

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan

Operatör

Sahin ERDOĞAN
Müh. Teknisyeni

Kayıt yeri : D:\PROGRA~1\BASINC~1\BETONK~1\986-KT1ST
Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.



Onaylayan

Lab. Şefi

YASAR SAĞLAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.: 5686
