

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 19.09.2007 ve 2007/90+-
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : 0 /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D2 BLOK ZEMİN KAT DÖŞEME KOLON
Yapı Sahibi : (D2 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D2 BLOK ZEMİN KAT

Yukarıda belirtilen yapının **DÖŞEME KOLON** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.


Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **29.11.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
VEFA İLTER




Yardımcı Kontrol Mühendisi
BESİM UFUK BALCI



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ŞENKA İNŞAAT TAAH.
ve TİC.LTD.ŞTİ.

Güzelyurt Mahallesi Akif Ersoy Cad. No: 8
Yakuplu / Beşiktaş / İSTANBUL
Beylikdüzü M.D.: 563 000 0898



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 19.09.2007 ve 2007/90+-
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : 0 /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D2 BLOK ZEMİN KAT DÖŞEME KOLON
Yapı Sahibi : (D2 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D2 BLOK ZEMİN KAT

Yukarıda belirtilen yapının **DÖŞEME KOLON** bölümünde ve **29.11.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **29.11.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
VEFA İLTER

Yardımcı Kontrol Mühendisi
BESİM UFAK BALCI

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ve TİC.LTD.ŞTİ.
Güzelyurt Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 8
Yakuplu / Beşiktaş / İSTANBUL
Beylikdüzü Y.D: 563 000 0898

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

RAPOR TARİHİ	27.12.07	RAPOR NO	871	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	-----	----------------	-----

FİRMA VE SANTIYE BİLGİLERİ

DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTIYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	/F21d24d2c/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ

NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY	ALINIŞ TARİHİ	29.11.07
ÜRETİCİ FİRMA	OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON	ALINIŞ SAATİ	
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C25 35	KATKI DURUMU	-
ALINDIĞI YER	D2 BLOK ZEMİN KAT DÖŞEME KOLON	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM*15CM*15CM KÜP		
NUMUNE SAYISI	6 İnşaat Teknisyeni		

YAPILAN DENEYLER

ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)	27
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)	
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm2)			
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN	
1	23.44	27.64	
2	22.79	30.93	
3	24.42	30.29	
ORTALAM A	23.55	29.62	N/mm2

AÇIKLAMA: Ortalama mukavemet > beton mukavemeti + 1

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

"Laboratuvar İzin Belgesi" ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

ONAYLAYAN

Samir K. SAM
İnşaat Teknisyeni



YASAR ZAGİ ALP
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Yöneticisi
Belge No: 5686

Numune Bilgileri :

Rapor No : 871
Rapor Tarihi : 27.12.2008


Yapı Sahibi : SELİN EVLER
İnşaat Adresi : MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada : 419 Pafta : F21d24d2c Parsel : 26
Katlı :
Test Standardı : TS EN 12390-3 Beton Cinsi : C 25
Kull. Yer : D2 BLOK ZEMİN KAT DÖŞEME Hazır Beton : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON
KOLON

Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık kg	Birim Ağırlık kg/dm ³	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü N.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	225.	3375.	7989.	2.37	28	29.11.07	27.12.07	621846.09	27.64		
2	225.	3375.	7968.	2.36	28	29.11.07	27.12.07	695931.21	30.93		
3	225.	3375.	7958.	2.36	28	29.11.07	27.12.07	681490.89	30.29		
Ortalama:								666422.73	29.62		

Deney Grafiği

Mukavemet (N/mm²)

Kırılma Yüğü (N)

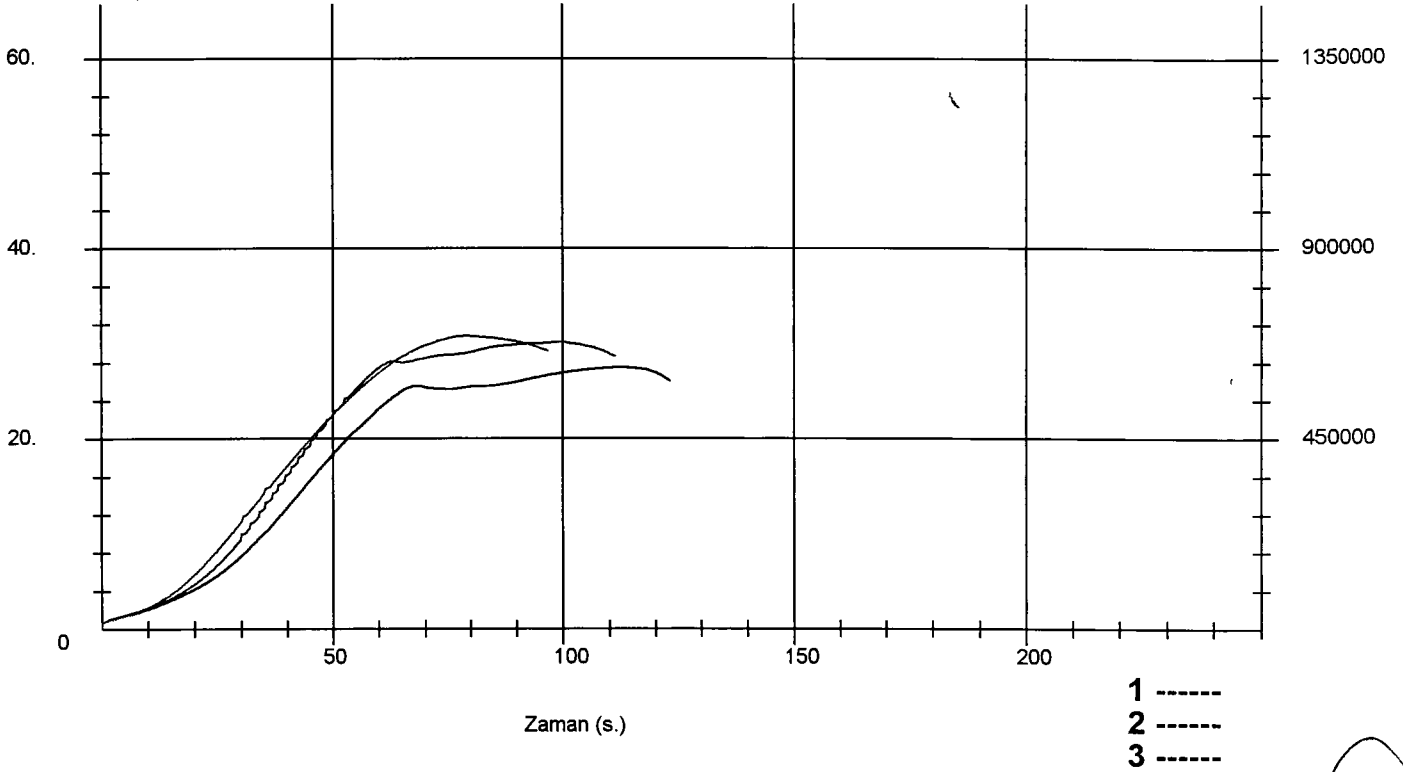

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan
Sami ERDOĞAN

Onaylayan
Yaşar SAĞLAM

Kayıt yeri: C:\ARZUIYEDİK\3006~1.07\MASAÜSTÜ\BASIC\871-XTST.TST
Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

YAŞAR SAĞLAM
İnşaat Mühendisi
Belge No: 5686
